



Проект организации воспитательной деятельности

Центр социального волонтерства «СоцАс»

Авторы:

*Гусева А.В., заместитель
директора по ВР*

*Карцева С.С., заместитель
директора по МР*

Место проекта «СоцАс» в программе развития колледжа

**Портфель проектов
Программы
развития колледжа**

1

2

Центр социального
волонтерства
«СоцАс»

3

Предпосылки реализации проекта «СоцАс»

Реализация задачи
Федерального проекта «Социальная активность»
национального проекта «Образование»

Наличие профессионально ориентированной
Модели воспитательной работы

Положительный опыт организации в колледже
волонтерской деятельности

Высокая мотивационная готовность
административной команды колледжа
к модернизации содержания
воспитательной деятельности

Центр социального
волонтерства
«СоцАс»

Цель проекта: к 2025 году в социальное волонтерство на базе центра «СоцАс» вовлечено 20% обучающихся Ростовского педагогического колледжа

Задача
1

- Разработать модель деятельности Центра социального волонтерства «СоцАс» на базе колледжа

Задача
2

- Разработать нормативно-правовую базу функционирования Центра социального волонтерства «СоцАс»

Задача
3

- Сформировать партнерскую сеть для социального волонтерства в рамках Центра социального волонтерства «СоцАс»

Задача
4

- Разработать и реализовать портфель инициатив и проектов по социальному волонтерству

Задача
5

- Обеспечить развитие навыков hard skills и soft skills у волонтеров Центра «СоцАс»

Задача
6

- Разработать и реализовать маркетинговую стратегию Центра социального волонтерства «СоцАс»


Формат работы Центра социального волонтерства «СоцАс»



Реализация конкретных социальных заказов мобильными волонтерскими группами



Разработка и реализация социальных инициатив и проектов, актуальных для колледжа, города Ростова и Ростовского муниципального района




Центр социального волонтерства «СоцАс»

ПРОБЛЕМА:

Низкая доля участия студентов колледжа в социальном волонтерстве

ЦЕЛЬ:

К 2024 году в социальное волонтерство на базе центра «СоцАс» вовлечено 20% обучающихся Ростовского педагогического колледжа

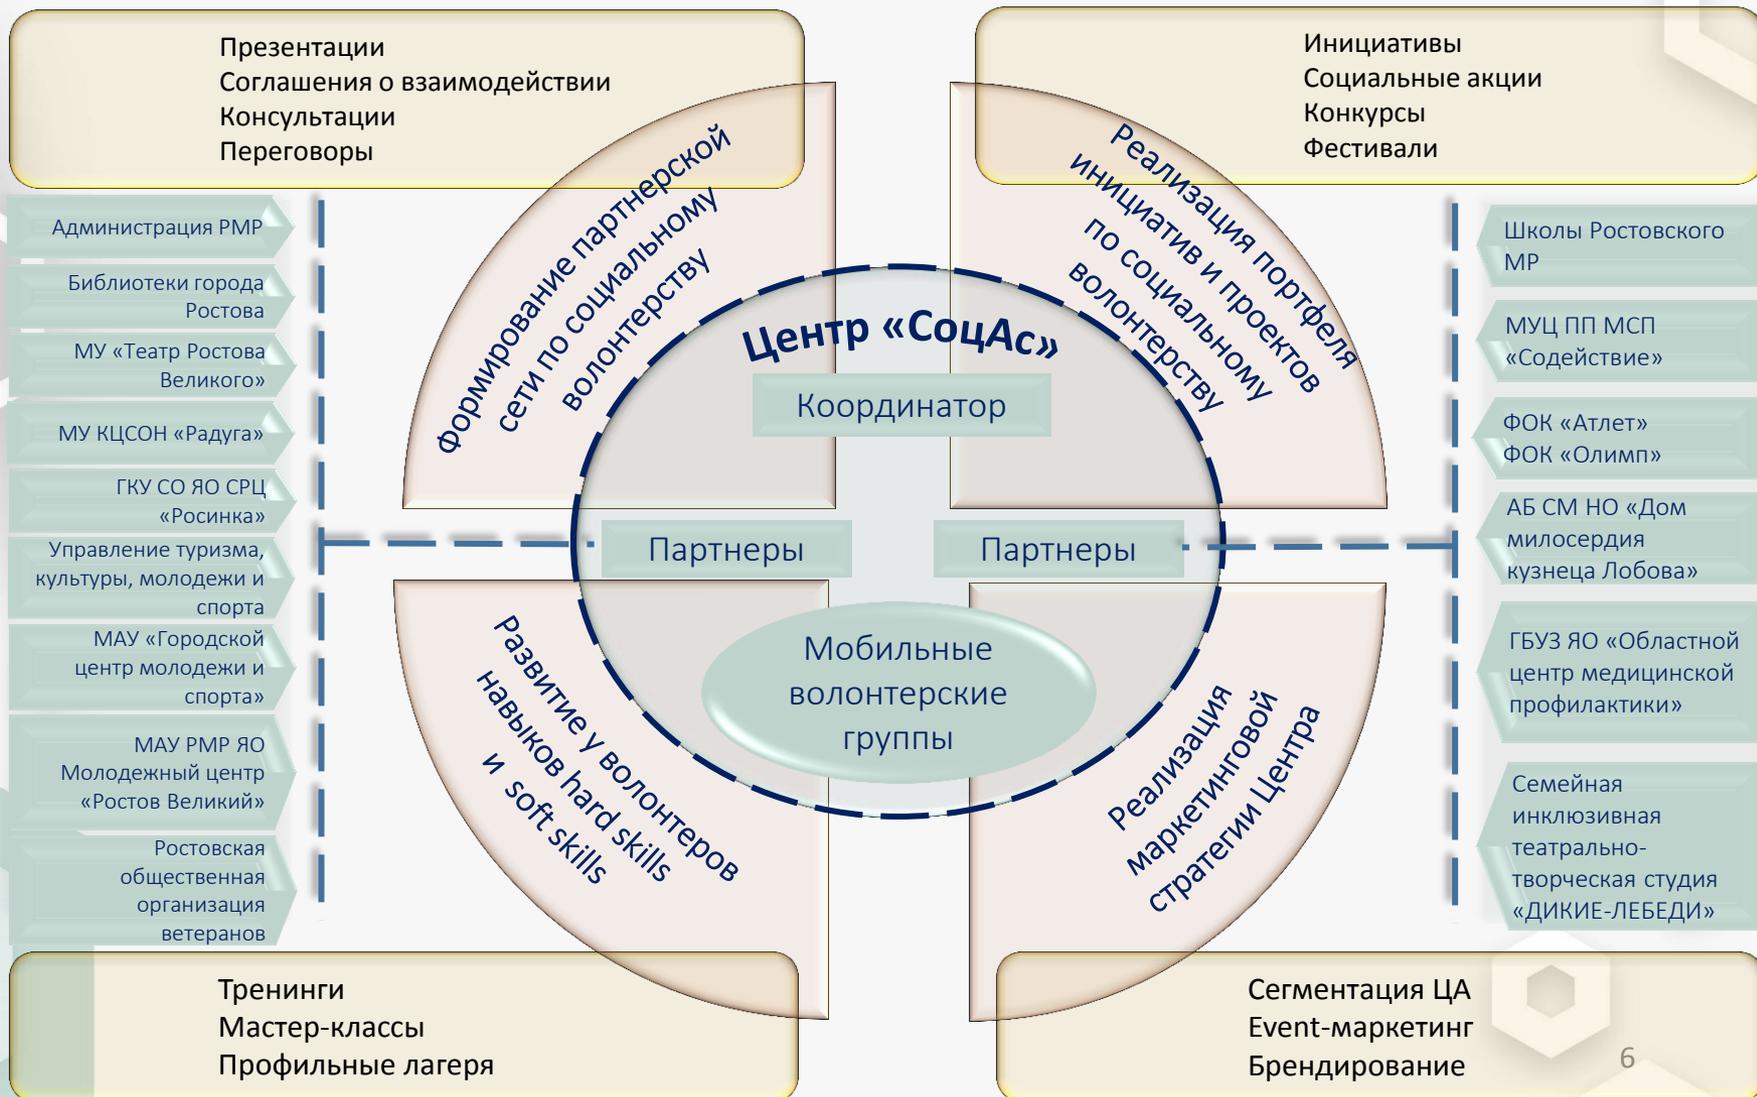

Дорожная карта проекта (фрагмент)

Наименование задачи, результата, мероприятия	Срок	Характеристика результата/продукта
Задача 4. Разработать и реализовать портфель инициатив и проектов по социальному волонтерству в условиях Центра социального волонтерства «СоцАс»		
Результат 4.1. Разработан и реализован портфель инициатив и проектов по социальному волонтерству в условиях Центра социального волонтерства «СоцАс»	Декабрь 2024 г.	Портфель включает не менее 30 инициатив и проектов по социальному волонтерству
Мероприятие 4.1.1. Организация работы проектных групп по разработке портфеля инициатив и проектов по социальному волонтерству	Сентябрь 2021 г. Сентябрь 2022 г. Сентябрь 2023 г. Сентябрь 2024 г.	План работы
Мероприятие 4.1.2. Фестиваль волонтерских инициатив и проектов «Добро начинается с нас»	Декабрь 2021 г. Декабрь 2022 г. Декабрь 2023 г.	Положение о Фестивале
Мероприятие 4.1.3. Реализация портфеля инициатив, проектов и социальных заказов по социальному волонтерству	Январь 2022 г. Январь 2023г. Январь 2024 г.	Отчёт о реализации
КТ: Презентация результатов работы в СМИ, на сайте колледжа и мессенджерах	Декабрь 2022 г. Декабрь 2023 г. Декабрь 2024 г.	Материалы презентации

Центр социального волонтерства «СоцАс»

Показатель	Базовое значение	2021	2022	2023	2024
Доля обучающихся колледжа, вовлеченных в социальное волонтерство	2	5	10	15	20
Количество реализованных социальных инициатив и проектов	3	3	10	15	30
Разработана модель деятельности Центра «СоцАс» на базе колледжа	0	1	1	1	1
Разработан пакет документов в рамках деятельности Центра по социальному волонтерству	0	1	1	1	1
Количество договоров о сотрудничестве с партнерами проекта	1	2	5	7	12
Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП), разработанных для обучения волонтеров	0	1	3	5	7
Доля студентов-волонтеров Центра «СоцАс», прошедших обучение по ДООП	0	25	50	75	100
Доля реализованных заказов на социальное волонтерство	10	50	50	75	100

Модель деятельности Центра «СоцАс»

Нормативно-правовая база функционирования Центра «СоцАс»

Партнерская сеть для социального волонтерства

Комплект инициатив и проектов по социальному волонтерству

ДООП для обучения волонтеров

Программы мини-курсов для обучения волонтеров

Мониторинг эффективности проекта «СоцАс»

Центр социального волонтерства «СоцАс»									
№ п/п	Сроки реализации	1	2	3	4	5	6	7	8
		Доля обучающихся колледжа, вовлеченных в социальное волонтерство - 2	Количество реализованных социальных инициатив и проектов - 3	Разработана модель деятельности Центра социального волонтерства «СоцАс» на базе колледжа - 0	Разработаны пакеты документов в рамках деятельности Центра по социальному волонтерству - 0	Количество договоров о сотрудничестве с партнерами проекта - 1	Количество дополнительных образовательных общеразвивающих программ (ДОАП) и зимних курсов, разработанных для обучения волонтеров - 1	Доля студентов колледжа первого Центра «СоцАс» прошедших обучение по ДОАП - 0	Доля реализованных заказов на социальное волонтерство - 10
1	январь			1	1				
2	февраль								
3	март						1		
4	апрель								
5	май								
6	июнь								
7	июль								
8	август								
9	сентябрь					2			
10	октябрь								
11	ноябрь								
12	декабрь	5	3					25	50
баллы за реализацию		1	2	2	1	1	2	0	1
комментарий		Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерство			документы на согласования	количество договоров увеличилось к сентябрю	обучение не закончено на данный момент,	заказы не реализованы в полном объеме из-за С19	

не реализованы	реализованы частично	реализованы в полном объеме
0	1	2
максим. балл	16	
сумма баллов	10	
процент	62,5	
результат	реализованы частично	

МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЗА 2021 ГОД				
Проекты	1	2	3	4
	Центр дополнительного образования «РостОК»	Центр социального волонтерства «СоцАс»	Комплекс профессионального развития CASHBACK-PROFFI	Программа развития
ПРОВЕРИТЬ				
не реализованы		Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерство увеличивается к концу 2021 года, количество договоров увеличивается к сентябрю, обучение не закончено на данный момент, заказы не реализованы в полном объеме из-за С19		Проект №1 в процессе реализации, проект №2 в процессе реализации, проект №3 в процессе реализации, кол-во обученных представителей различных целевых групп увеличивается к декабрю
реализованы частично				
реализованы в большей степени				
реализованы в полном объеме				

Управление проектом



Риски проекта

№ п/п	Наименование риска	Действия по предупреждению (минимизации) риска
1.	Недостаточная мотивационная готовность студентов колледжа к социальному волонтерству	Информирование о преимуществах волонтерской деятельности, обучение, включение в социальное проектирование
2.	Недостаточная готовность педагогических кадров к реализации проектной деятельности в социальной сфере	Проведение проектных мотивирующих семинаров Обучение кадров Учет деятельности работников, участвующих в проектной деятельности, при определении результатов эффективности
3.	Недостаток ресурсов (финансовых, материальных) для реализации отдельных социальных заказов	Развитие фандрайзинга, привлечение ресурсов заинтересованных сторон, совместное планирование социальных инициатив и проектов, участие в конкурсах с призовым фондом на реализацию проектов
4.	Профессиональная некомпетентность волонтерских групп для реализации отдельных социальных заказов	Обучение через мини-курсы, процессное консультирование руководителей мобильных волонтерских групп
5.	Большое количество социальных заказов («социальный аврал»)	Обучение элементам тайм-менеджмента руководителей (хронометраж, матрица Эйзенхауэра, правило Парето и пр.)

Ресурсы проекта «СоцАс»



Эффекты реализации проекта



Повышение открытости колледжа

Формирование команды педагогов, владеющих технологией продвижения социального волонтерства

Новый формат воспитательной работы



Повышение качества жизни, социальной мобильности



Дополнительные навыки и компетенции

Приверженность к будущей профессии и расширение базы социальных контактов

Формирование просоциального поведения



Повышение качества и скорости решения социально значимых проблем



Развитие инфраструктуры добровольчества на территории региона

Перспективы использования результатов проекта


развитие на базе Центра волонтерства иных направлений добровольчества: событийного, спортивного, экологического

инициация научно-исследовательской деятельности по социальному волонтерству

создание на базе колледжа стажировочной площадки по социальному волонтерству

участие в проектах и конкурсах федерального и международного уровней

публикации в СМИ, научных изданиях, в интернет-сообществах о ходе и результатах реализации проекта

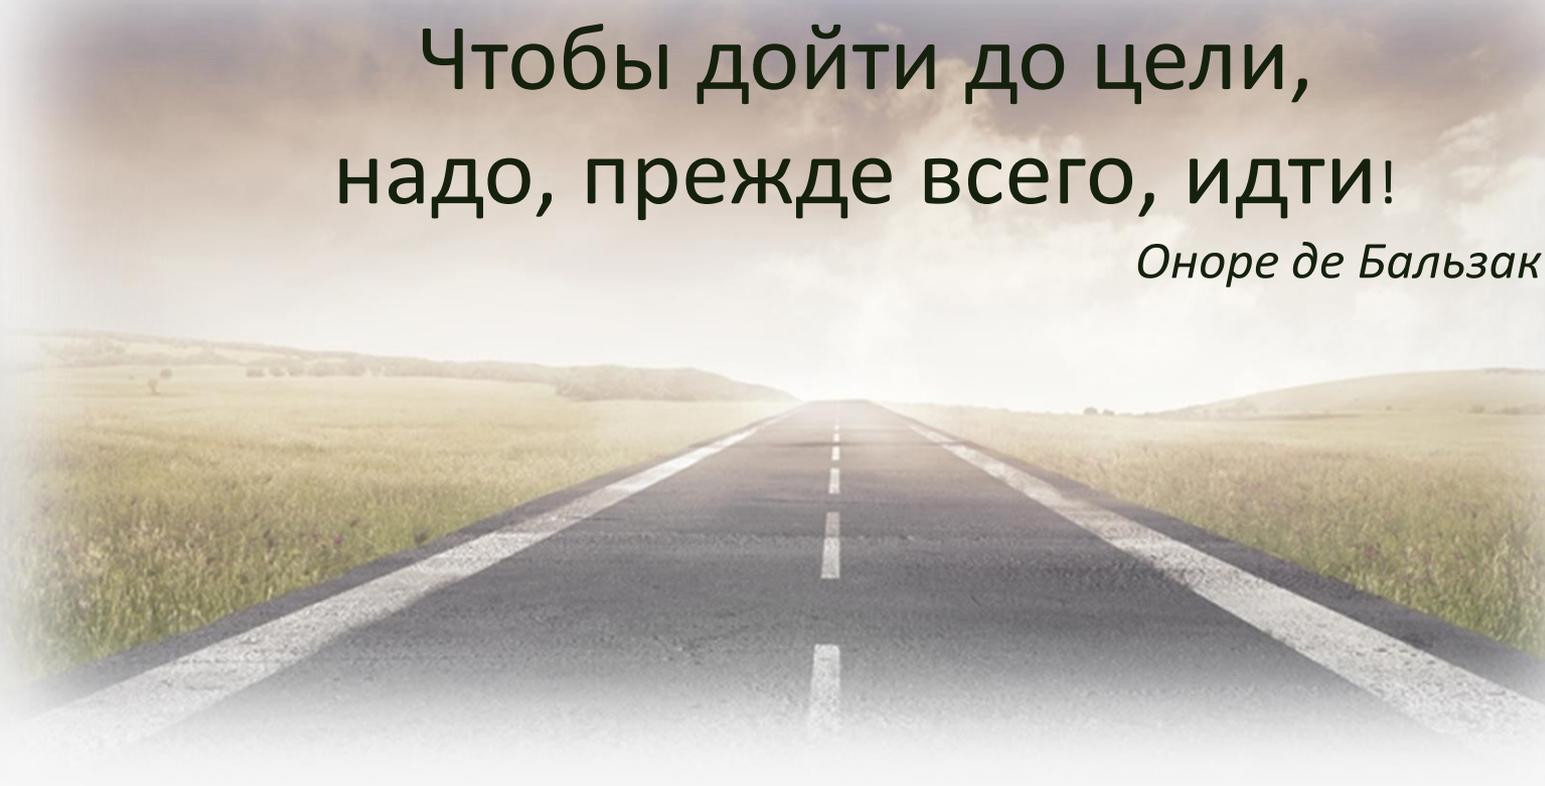

Чтобы дойти до цели,
надо, прежде всего, идти!

Оноре де Бальзак

ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж
